Shape
Your
Business

London Consulting Group®



Octubre 2026

¿*Quiénes* somos?

londoncg.com

+5,000

Proyectos

Mejorando la *rentabilidad* de las compañías.

NORTEAMÉRICA CENTROAMÉRICA SUDAMÉRICA CARIBE EUROPA

Resultados con *escalabilidad*

Garantizamos por contrato un Retorno sobre la Inversión de al menos 1:1.

5 a 1

ROI Promedio

¿*Qué* hacemos?

Liberamos tu potencial

Trabajamos las áreas *estratégicas* y *operativas* para obtener más de tu negocio.

Ponemos a tu cliente al centro de todo lo que hacemos y garantizamos *resultados sostenibles*.

Nuestra experiencia

Clientes *Multinacionales*



Clientes *Regionales*



Clientes *Regionales*



¿*Cómo lo* hacemos?

londoncg.com

Así *Impulsamos* tu negocio



CLIENTE
CX
EXPERIENCIA

Estrategia

Propósito / Oferta de Valor

Procesos

Simplificación / Agilidad

Madurez Organizacional

Analítica de Datos

Indicadores y Modelos de Gestión

EXCELENCIA
OX
OPERACIONAL

Gente

Competencias / Liderazgo / Cambio

EXPERIENCIA / INTERFAZ
UX / UI
DE USUARIO

Tecnologías Habilitadoras

Metodologías Ágiles

Metodologías Change Management

¿Qué sigue después del *prediagnóstico*?

2

TRANSFORMACIÓN

8-10 meses

para encontrar tu potencial

Análisis Exhaustivo

- *Análisis Exhaustivo*

Modelo de Gobierno

- *Alineación Estratégica*
- *Macroestructura*
- *Modelo Indicadores*
- *Análisis de Sistemas*

Diseño e Implementación

- *Sprints de Análisis*
- *Usuario al Centro*
- *Acompañar el Viaje del Cambio*

2 MESES
Deep Dive Analysis

7 MESES
Proyecto

londoncg.com

1

PREDIAGNÓSTICO

Estudios de Factibilidad

- *Entrevistas*
- *Resumen Oportunidades*
- *Propuesta Proyecto*

2 SEMANAS
Conversación inicial

2

TRANSFORMACIÓN

Análisis Exhaustivo

- *Análisis Exhaustivo*

Modelo de Gobierno

- *Alineación Estratégica*
- *Macroestructura*
- *Modelo Indicadores*
- *Análisis de Sistemas*

2 MESES
Deep Dive Analysis

Diseño e Implementación

- *Sprints de Análisis*
- *Usuario al Centro*
- *Acompañar el Viaje del Cambio*

7 MESES
Proyecto

3

CONTINUIDAD

Visitas de Continuidad para monitorear ROI

- *Cuarto de Control*
- *Visitas Post Proyecto*

1 AÑO
Monitoreo ROI

London Consulting Group®

PATE

México

Proyecto Excelencia Operativa & Optimización del Costo



Octubre, 2026

londoncg.com

Etapas del Proyecto



SEM 01-04

ANÁLISIS EXHAUSTIVO

- Levantamiento VSMs
- Análisis de Perfiles & Mindset
- Analítica de Datos
- Gemba Walks
- Definición de Estructura Organizacional
- Backlog de Historias

SEM 05-15

QUICK WINS

- Iniciativas Rápidas de Alto Impacto y Bajo Esfuerzo

SEM 06-10

ESTRATEGIA & ESTRUCTURA

- Alineación Estratégica
- Macroestructura
- Microestructura
- Plan Maestro

SEM 05-20

DISEÑO

- Modelos Operativos, Procesos Indicadores
- Herramientas Digitales
- Días Típicos Puestos Clave
- Políticas
- Pre-Manuales
- Plan de Capacitación e Implementación

SEM 20-22

CAPACITACIÓN

- Ejecución de Implementación
- Certificación teórica
- Certificación práctica

SEM 15-34

IMPLEMENTACIÓN

- Acompañamiento Hombro a Hombro
- Nivel Implementación Procesos & Digital
- Nivel de Coaching

SEM 33-34

DOCUMENTACIÓN

- Matriz de auditoría
- Procesos implementados

A

AWARENESS
CONCIENCIA

"Entiendo el porqué de este cambio…



D

DESIRE
DESEO

"Deseo participar con un rol protagónico…



K

KWOWLEDGE
CONOCIMIENTO

"Sé cómo implementar el cambio…"



A

ABILITY
HABILIDAD

"Demuestro y puedo hacer esto por mí mismo…"



R

REINFORCEMENT
REFUERZO

"No hay vuelta atrás…"



FASE 01 · SEMANAS 1–4

Análisis exhaustivo

Entendimiento a detalle de cada área y proceso



01
Nivel de madurez organizacional



02
VSM · Analítica de datos operativo



03
Análisis de estructura y capacidad instalada



04
Gemba walks



05
Análisis de talento y compensaciones



06
Madurez digital

FASE 02 · SEMANAS 6-10

Macroestructura

Cinco pasos: de la alineación de objetivos a la estructura final puesto-persona

1

ALINEACIÓN

Alineación de objetivos

Workshop de alineación de objetivos estratégicos.

1.1 Cronograma Macro Monday

1.2 Concientización

1.3 Workshop de Alineación Estratégica

2

ESTRUCTURA ACTUAL

Funciograma y FODA

Análisis del funciograma actual y FODA de la estructura organizacional.

2.1 Workshop de funciograma y tramos de control

2.2 Workshop de FODA

3

MEJORES PRÁCTICAS

Premisas nueva estructura

Estudio de benchmark y premisas derivadas de los workshops anteriores.

3.1 Benchmark

3.2 Premisas Nueva Estructura

4

CREACIÓN

Propuestas de estructura

Propuestas elaboradas con los directores y selección final por votación.

4.1 Elaboración de propuestas

4.2 Selección Final

4.3 Foros de Modelo de Gobierno

5

NOMBRE Y CARGOS

Puesto – Persona

Macroestructura final con KPIs, funciones, semanas típicas y perfiles por competencias. Planes de acción para tripular la estructura ideal.

5.1 Estructura Final

5.2 Puesto-Persona

FASE 03 · SEMANAS 8-10

Método de evaluación financiera

Cuantificar beneficios financieros y definir parámetros de seguimiento desde el Periodo Base

IMPLEMENTACIÓN

Diseñado por el Gerente de Proyecto, revisado por el Director del área y **aprobado por el Director de Finanzas**. Seguimiento en Juntas Semanales de Avance (JSA).

RESULTADO

Garantiza alineación financiera y operativa, facilitando la medición del **ROI del proyecto**.

COMPONENTES CLAVE

01 Identificación de áreas impactadas e indicadores clave.

02 Diseño de indicadores en Power BI con medición de resultados y ahorros proyectados.

03 Validación de datos financieros y establecimiento del Periodo Base.

04 Mediciones periódicas y seguimiento en JSA.



EJEMPLO DEL ENTREGABLE

FASE 02 · SEMANAS 6–10

Microestructura

Cuatro pasos: de la carga de trabajo a la estructura final tripulada



ENTREGABLE

Estructura ideal puesto-persona

1

ENTENDIMIENTO

Carga de trabajo

Contar los puestos de trabajo de la organización e identificar su tipo.

Revisar y validar los listados de actividades junto con sus reportes directos.

Eliminar actividades que no aportan valor y definir las que deben sistematizarse o reasignarse.

2

ANÁLISIS DEL PERSONAL

Perfiles de competencias

Evaluar al personal para identificar competencias sobresalientes y áreas de oportunidad.

Comparar el perfil de cada persona con el de su puesto.

Aplicar pruebas de inteligencia, personalidad, comportamiento, valores y perfil.

3

PLAN MAESTRO

Capacity plan

Calcular la carga de trabajo por puesto.

Definir la cantidad óptima de recursos para asegurar la operación de procesos clave.

Identificar cantidad actual vs. cantidad ideal de personas por puesto según ocupación.

4

CREACIÓN

Estructura final

Definir personas necesarias para tripular la estructura.

Establecer tramos de control en todas las líneas de la estructura.

Asignar tabuladores y centros de costo para los puestos.

Elaborar cronograma de implementación y comunicación.

FASE 03 · SEMANAS 5–15

Quick Wins

Iniciativas de alto impacto y bajo esfuerzo: resultados a corto plazo en 8 a 12 semanas

1

Diagnóstico integral

Identificación de brechas y fricciones operativas mediante análisis.

2

Talleres focalizados

Sesiones dirigidas con usuarios clave para mapear pain points críticos.

3

Consolidación de insights

Integración de hallazgos del diagnóstico, entrevistas y sesiones colaborativas.

4

Priorización estratégica

Valoración de iniciativas según impacto, viabilidad y esfuerzo.

5

Activación de Quick Wins

Definición del reto central y ejecución inmediata de soluciones de alto retorno.

FASE 03 · SEMANAS 5–15

Business Intelligence

Inteligencia de negocio con el usuario al centro

1

Definición de variables, periodos base y objetivos

Acuerdo de **variables clave** e identificación de métricas asociadas.

Acuerdo de **períodos de comparación** e identificación de método de cálculo.

Acuerdo de **excepciones**.

Definición de **períodos base** y de **objetivos**.

2

Definición y diseño de indicadores

Definir **KPIs críticos** para monitorear el desempeño.

Asignar **roles responsables** y asegurar responsabilidad.

Establecer **metas claras y alcanzables**.

Seleccionar fuentes de **datos confiables**.

3

Modelos de gestión

EJECUTIVO · ESTRATÉGICO · TÁCTICO · OPERATIVO

Definir **Foros de Gestión**.

Definir los **objetivos de cada foro** y modelo de gestión.

Definir indicadores específicos para cada temática de la reunión.

Minuta y modelo de **feedback**.



TABLERO DE INDICADORES · APP MÓVIL

FASE 04 · SEMANAS 5-20

Diseño

Mapas de flujo de valor por área con metodologías ágiles, alineados a mejores prácticas

VALUE STREAM MAPPING

Desarrollar el **mapa de flujo de valor** de cada área, basado en una visión integral del negocio, que dé solución a las historias que ejemplifican las áreas de oportunidad actual.

METODOLOGÍAS ÁGILES

Alinear los procesos a mejores prácticas y priorizar las iniciativas con mayor efecto en la **excelencia operacional** y la experiencia del cliente y del usuario.

DESIGN SPRINT

Esquema y límite de tiempo definidos

1	2	3	4	5
Definir reto	**Buscar soluciones**	**Elegir soluciones**	**Realizar prototipo**	**Testeo de usuarios**

INVENTARIO GENERAL DE ENTREGABLES

- PASER
- MODELOS CONCEPTUALES
- POLÍTICAS
- APPS, HERRAMIENTAS Y FORMATOS
- INDICADORES (KPI'S)
- VIVENCIA DEL USUARIO
- CHECKLIST DE COACHING

FASE 05 · SEMANAS 20–22

Capacitación

Transferencia de conocimiento, responsabilidades y empoderamiento del personal que ejecuta los procesos

CAPACITACIÓN FORMAL

Con todos los involucrados **directamente en el proceso**.

PRE-MANUAL DIGITAL

La capacitación se realiza a través de **pre-manuales digitales**, que permiten transferir el conocimiento de los diseños que se implementarán en las diferentes áreas.



PRE MANUAL DIGITAL · EJEMPLO

PLANEACIÓN · ASIGNACIÓN · SEGUIMIENTO · EVALUACIÓN · RETROALIMENTACIÓN

FASE 06 · SEMANAS 15–34

Implementación

Coaching con seguimiento individual y retroalimentación vertical


RETROALIMENTACIÓN VERTICAL

Cada coaching que realizamos tiene un **seguimiento individual de retroalimentación vertical** al colaborador, con el detalle a su jefe directo y al Director del área.

EFECTO

Permite especificar de mejor manera **los planes de acción** y, por ende, la **madurez del perfil** y los **resultados**.

COLABORADOR › JEFE DIRECTO › DIRECTOR

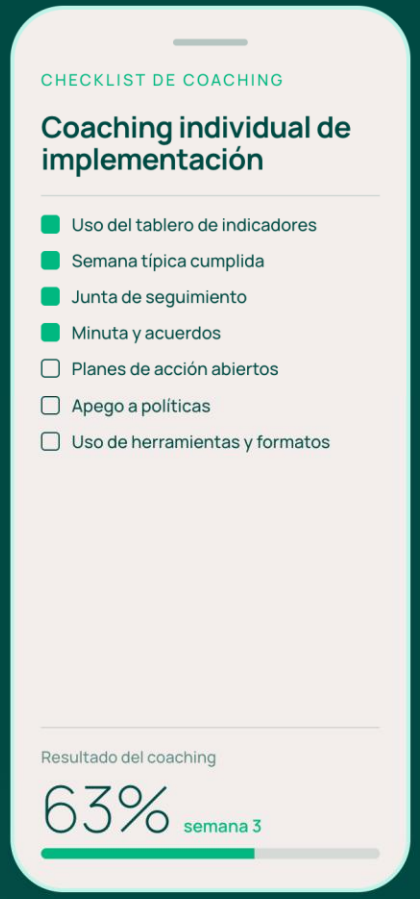

CHECKLIST EN CAMPO



FASE 07 · SEMANAS 33-34

Documentación

Documentar todos los sistemas de trabajo, modelos operacionales y herramientas diseñadas e implementadas

ENTREGABLES DE LA DOCUMENTACIÓN

01 **Índice**

02 **Semanas típicas**

03 **Checklist de coaching**

04 **Modelos (diagramas de flujo)**

05 **Políticas**

06 **Herramientas y formatos**

07 **Tablero de indicadores**

08 **Bases de datos**

09 **Video tutoriales**

10 **Descriptivas y manuales de uso**

CUARTO DE CONTROL

Se selecciona una persona o un equipo de personas como cuarto de control para:

01 Realizar **auditorías internas** para los sistemas de trabajo implementados.

02 Actualizar los **métodos de cálculo** de valuación financiera del proyecto.

03 Dar **mantenimiento al modelo de gestión** del proyecto.

MATRIZ DE AUDITORÍA

Herramienta para validar la continuidad de los modelos implementados durante el proyecto.


ESTRATEGIA DE GROWTH MANAGEMENT

La **implementación exitosa** de un proyecto conlleva gestionar **la transición individual** de los colaboradores y sus líderes, **Growth Managment** contempla una estrategia integral para habilitar y liderar el **lado humano** del cambio a través de **3 ejes**.

Change Management

Habilitar a todos los líderes de la organización y asegurar que cada sponsor tenga un rol protagónico/responsabilidad en la gestión del cambio.

Gestión moderada, programas limitados de upskilling, *falta de claridad en roles*, y crecimiento no integrado en la cultura.

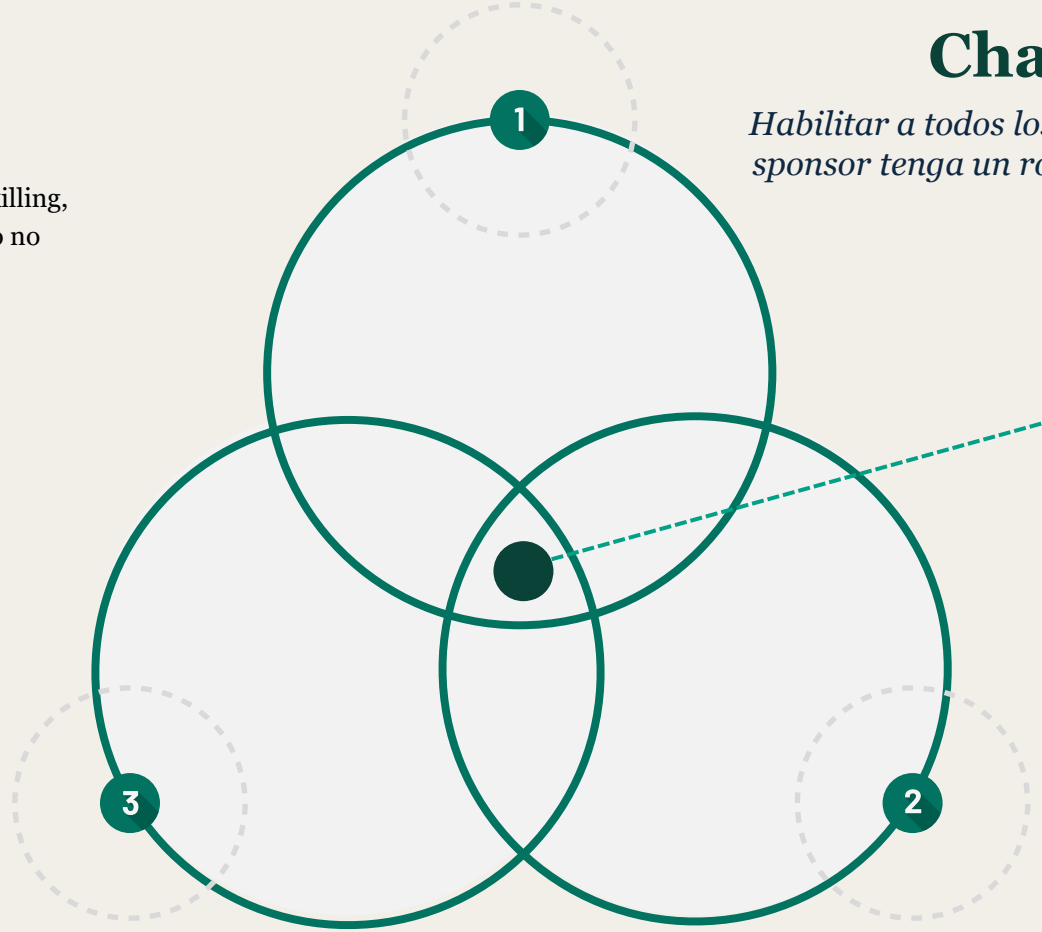

Lideres
PATE

Desarrollo Organizacional

Habilitar los procesos necesarios para el desarrollo del talento de manera interna.

Desarrollo de Líderes

Asegurar el desarrollo de competencias y *nueva mentalidad* de líderes.



Shaping Business TOGETHER

(GROWTH MANAGEMENT)

London Consulting Group®

PROYECTO MEJORA

- ESTRATEGIA DE NEGOCIO -

GOBIERNO, CONTRALORÍA & GESTIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA







1. ABASTO AVES & INTELIGENCIA PROSPECCIÓN

- Modelo de Punto de Equilibrio
- Forecast de Demanda
- Presupuesto de Abasto (Socios, No socios, Edades, Granjas)
- Inteligencia de Abasto (Elasticidad, Precio de Huevo, Distancias, Tipo de Productor)
- Lista de Precios de Precios Dinámica, alineada al modelo de rentabilidad para captar Abasto
- S&OP (Sales and Operations Planning)
- Medición y Gestión de Cambios de Programa de Abasto

2. PRODUCCIÓN (DESHUESE, PASTAS & EMPAQUE)

- Medición digital de rendimiento por lote, turno, mesa y operador (canal, carne y hueso)
- Balance de masa con pesajes por etapa y cierre de mermas
- Dotación de deshuese ajustada al volumen diario (estaciones, turnos y polivalencia)
- Estándares de productividad y esquema de incentivos (rendimiento vs. velocidad)
- OEE (Eficiencia Global)

3. VENTAS, ALMACENES & LOGÍSTICA

- Control de Inventarios (Cíclicos, Toma Física, Discrepancias Sistema)
- Layout y Clasificación ABC de Almacenes (Ubicación, Acceso, Rotación)
- Track y Seguimiento de venta con Comercial PROAN
- OTIF y cumplimiento de pedidos (fecha solicitada, prometida y real)
- Costo logístico de salida (fletes, maniobras y utilización de unidades)
- Indicadores de Desempeño (Rotación, Cobertura, Confiabilidad, Obsolescencia)

4. MANTENIMIENTO (PREVENTIVO & CORRECTIVO)

- Plan de mantenimiento preventivo y medición de su cumplimiento
- Criticidad de equipos y control de fallas (MTBF y MTTR)
- (Digital) Bitácora única de paros y órdenes de trabajo (causa, equipo y duración). Incluyendo refacciones.
- Gasto de refacciones: criticidad, inventario mínimo y tiempos de reposición
- Eficiencia energética y trazabilidad eficiencia operativa de electricidad, agua y vapor por área

5. CONTRALORÍA (MODELO DE COSTEO)

- Modelo de costeo por ave y por kg
- Estado de costos por centro de costo (matanza, eviscerado, deshuese, pastas y empaque)
- Margen de contribución por ave y por producto
- Separación contable: servicio al accionista, industria y comercial
- Costos fijos vs. variables del proceso y punto de equilibrio
- Conciliación de aves enviadas vs. recibidas y su efecto en costo

6. TECNOLOGÍA: DIGITALIZACIÓN / DATA ANALYTICS / FÁBRICA VISUAL / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

7. ESTRUCTURA / DESARROLLO LIDERES / MANEJO CAMBIO

PATE
(PROCESADORA DE AVES DE TEPA)

London Consulting Group®

MODELOS A IMPLEMENTAR:

ABASTO AVES & INTELIGENCIA PROSPECCIÓN

- Modelo de Punto de Equilibrio (por ave, por kg y por escenario de volumen).
- Modelo de Forecast de Demanda (por producto y por cliente).
- Modelo de Presupuesto de Abasto (por socio, edad de parvada y granja).
- Modelo de Inteligencia de Abasto (elasticidad, precio del huevo, distancias y tipo de productor).
- Modelo de Lista de Precios Dinámica (alineada a la rentabilidad para captar abasto).
- Modelo de S&OP y Gestión de Cambios de Programa de Abasto (programado vs. real).

PRODUCCIÓN (DESHUESE, PASTAS & EMPAQUE)

- Modelo de Medición Digital de Rendimiento (por lote, turno, mesa y operador).
- Modelo de Balance de Masa (pesajes por etapa y cierre de mermas).
- Modelo de Dotación de Deshuese (estaciones, turnos y polivalencia vs. volumen diario).
- Modelo de Estándares de Productividad e Incentivos (rendimiento vs. velocidad).
- Modelo de Gestión de Eficiencia OEE (disponibilidad, rendimiento y calidad).

VENTAS, ALMACENES & LOGÍSTICA

- Modelo de Control de Inventarios (cíclicos, toma física, discrepancias sistema).
- Modelo de Layout y Clasificación ABC de Almacenes (ubicación, acceso y rotación).
- Modelo de Tracking y Seguimiento de Venta con Comercial PROAN.
- Modelo de Plan de Ventas y Producción (reducción de inventario sin venta).
- Modelo de OTIF y Cumplimiento de Pedidos (fecha solicitada, prometida y real).
- Modelo de Costo Logístico de Salida (fletes, maniobras y utilización de unidades).
- Modelo de Indicadores de Desempeño de Inventario (rotación, cobertura, confiabilidad y obsolescencia).

OBJETIVOS:

- Incrementar el rendimiento de carne por ave y cerrar el balance de masa.
- Ajustar la dotación de deshuese al volumen diario y reducir horas extra.
- Elevar la disponibilidad de equipos críticos y reducir paros no programados.
- Implementar un modelo de S&OP (best practice) entre abasto, producción y ventas.
- Reducir el inventario sin venta y mejorar el OTIF.
- Reducir aves ahogadas (DOA) y mejorar el cumplimiento del programa de abasto.
- Contar con costo por ave, por kg y margen de contribución confiables.
- Incrementar el uso y la trazabilidad digital (Un solo dato).

PROPUESTAS DE QUICK WIN (Semana 1-10)

- MVP del Comité de S&OP (abasto, producción y ventas).
- Tablero semanal de rendimiento y balance de masa por lote.
- Bitácora Digital única de paros y órdenes de mantenimiento (inicio con equipos críticos).
- Primera versión del costo por ave y margen de contribución (modelo de costeo v1).

MODELOS A IMPLEMENTAR:

MANTENIMIENTO (PREVENTIVO & CORRECTIVO)

- Modelo de Mantenimiento Preventivo (plan, programación y cumplimiento).
- Modelo de Criticidad de Equipos y Control de Fallas (MTBF y MTTR).
- Modelo de Bitácora Única de Paros y Órdenes de Trabajo (causa, equipo, duración y refacciones).
- Modelo de Gestión de Refacciones (criticidad, inventario mínimo y tiempos de reposición).
- Modelo de Eficiencia Energética (submedición de electricidad, agua y vapor por área).

CONTRALORÍA (MODELO DE COSTEO)

- Modelo de Costeo por Ave y por Kg (asignación de costos conjuntos).
- Modelo de Estado de Costos por Centro de Costo (matanza, eviscerado, deshuese, pastas y empaque).
- Modelo de Margen de Contribución (por ave y por producto).
- Modelo de Separación Contable (servicio al accionista, industria y comercial). Modelo de Costos Fijos vs. Variables y Punto de Equilibrio.
- Modelo de Conciliación de Aves Enviadas vs. Recibidas (efecto en costo).

HERRAMIENTAS

Microsoft Power Platform · Claude · SAP · marel food systems

+ sistemas internos, externos & AI...

London Consulting Group®

México

Equipos & *Inversión*

Octubre, 2026

EQUIPO, INVERSIÓN & RETORNO

Base contra objetivo

Ahorro acumulado en el proyecto más 12 meses, por palanca y por escenario. Indicador actual, objetivo con los controles de arriba y ahorro por palanca.

PALANCA	ÁREA	BASE	OBJETIVO	DIRECTO	DILUCIÓN	CONSERVADOR (PROYECTO + 12 M)	AMPLIADO (PROYECTO + 12 M)	POR AVE (AMPLIADO)
OEE	Deshuese 2	63.7%	70%	$4.8 M	$10.9 M	$12.2 M	**$20.8 M**	$0.67
Rendimiento primario de pechuga	Deshuese 2	18.16%	19.16%	$8.2 M	—	$5.3 M	**$11.0 M**	$0.35
Horas sin producir	Líneas	1.27 h/día	0.27 h/día	$4.9 M	$11.2 M	$14.3 M	**$21.5 M**	$0.69
Personas sobre autorizada	Personal	+23	+3	$5.5 M	—	$3.7 M	**$7.3 M**	$0.23
Horas extra fuera de Deshuese	Personal	$11.5 M	$7.5 M	$4.0 M	—	$3.9 M	**$5.4 M**	$0.17
Refacciones y correctivos	Mantenimiento	$26.2 M	$23.5 M	$2.6 M	—	$3.5 M	**$3.5 M**	$0.11
Energía y gas	Mantenimiento	$43.9 M	$41.3 M	$2.6 M	—	$2.9 M	**$3.5 M**	$0.11
Directo y dilución son del ahorro por año con los controles actuales. Volumen estabilizado: 1.82 M → 1.95 M aves al mes.								
Total proyecto + 12 meses		**Costo neto $25.47**	**$23.13**	**$32.7 M**	**$22.1 M**	**$45.8 M**	**$73.0 M**	**$2.34**

ROI

3.2 : 1

Inversión total

$22,560,000

MXN + IVA

$73´053,000

MXN

RETORNO OBJETIVO

EQUIPO & MODELO DE GOBIERNO

Modelo de Gobierno

Junta Mayor

Junta Semanal de Avance

Juntas Operativa

S&OP

Comités Ágiles

Scrums

Administración del Cambio

Consejo (Colombia)

Junta Mayor: *Se presenta al consejo y al Director General el avance cada 5 semanas.*

Director Operaciones LCG

Gerente General Contraloría

Sponsors Principales

Junta Semanal de Avance: *Presentan desarrollo del proyecto a Gerente General los Líderes Funcionales + Equipo Integrado + Equipo LCG*

Gerente General Contraloría Gerente Producción

Líderes Funcionales

Equipo Requerido

TIEMPO COMPLETO

Gerente LCG (Abasto Aves)

Champions

Jefes Área
Coordinadores de Área

Consultor LCG (Contraloría + Ventas, Almacenes y Logística)

Consultor LCG (Producción: Deshuese, Pastas y Empaque)

Consultor LCG (Mantenimiento)

Consultor P&C

Equipo Integrado

Equipo Integrado

Equipo Integrado

Equipo Integrado

Equipo Integrado Capital Humano

Administración del Cambio

Comités Ágiles
Resto de Áreas

FIGURAS CLAVE

Sponsor

- Participar activa y visiblemente a lo largo del proyecto.
- Construye una coalición de patrocinio con lideres funcionales y Champions.
- Responsable de la comunicación estratégica
- Toma de decisiones y elimina barreras organizacionales.

Champions

- Proponen y validan los cambios a los modelos de trabajo y estructuras
- Son promotores del cambio ante sus equipos y sus pares
- Ayudan a gestiona las resistencias de su equipo y de sus pares.
- Actúan como evangelizadores



Líderes Funcionales

- Principales responsables del avance del proyecto y los resultados del mismo en sus áreas.
- Semanalmente acuerdan con el consultor el plan de trabajo y sus respectivos entregables.
- Validan y aportan sobre las propuestas de análisis y diseño.
- Son agentes de cambio, comunican de manera inmediata problemas potenciales y proponen soluciones.

Equipos Integrados

- Participan 100% del tiempo durante el proyecto. Líderes operativos, que no están necesariamente en una posición de autoridad, sin embargo, tienen buen entendimiento de sus áreas.

- Son colaboradores de alto potencial que el proyecto les dará una metodología para formarlos como consultores internos y eventualmente conformar el área de cuarto de control y mejora continua.

PERFIL EQUIPOS INTEGRADOS

Características Básicas

- Disponibilidad de tiempo completo al proyecto (100%)
- Alto potencial de desarrollo
- Capacidad y disposición para desarrollar trabajo operativo
- Capacidad de análisis y síntesis
- Sin paradigmas y de mente abierta
- Capacidad de trabajar en equipo
- Sin restricciones de horario (trabajo hasta las 18:00 hrs.)
- Compromiso total con la Organización
- Manejo de herramientas computacionales (Excel, Word, PPT)
- Orientación a resultados
- Excelente actitud hacia el cambio (objetividad, análisis, saber escuchar

Características Deseables

- Dominio de la cultura organizacional de la empresa
- Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo
- Conocimiento de la operación y de las áreas de la organización (a nivel procesos y sistemas)
- Experiencia en diseño de procesos

PLAN DE PAGOS

Plan de Pagos PATE			
Fecha	Mes	Pago (MXN)	Pago (MXN) + IVA
02-11-26	Anticipo	$ 2,256,000	$ 2,616,960
02-11-26	1	$ 2,388,706	$ 2,770,899
30-11-26	2	$ 2,388,706	$ 2,770,899
28-12-26	3	$ 2,388,706	$ 2,770,899
25-01-27	4	$ 2,388,706	$ 2,770,899
22-02-27	5	$ 2,388,706	$ 2,770,899
22-03-27	6	$ 2,388,706	$ 2,770,899
19-04-27	7	$ 2,388,706	$ 2,770,899
17-05-27	8	$ 2,388,706	$ 2,770,899
14-06-27	9	$ 1,194,353	$ 1,385,449
Total		$ 22,560,000	$ 26,169,600

- *Anticipo del 10% del valor total del proyecto*
- *Más 9 pagos mensuales*
- *El plan de pagos está expresado en MXN (pesos mexicanos)*
- *El plan de pagos es + IVA*
- *Los pagos se programan para los ´lunes de la semana cronograma*

COMPROMISOS

- London se compromete a completar el enfoque del proyecto dentro del costo pactado.
- London se compromete a lograr un retorno de inversión como mínimo de 1 : 1 a un año después de la implementación.
- London se compromete a mantener bajo estricta confidencialidad la información proporcionada por PATE (Procesadora de Aves de Tepa).
- PATE (Procesadora de Aves de Tepa) se compromete a proporcionar el tiempo necesario de su personal para el logro de los objetivos.
- Todos los nuevos sistemas, políticas, procedimientos, estándares y prácticas, quedarán totalmente documentados en manuales de procedimientos.
- La responsabilidad del éxito del Proyecto se comparte entre London y PATE (Procesadora de Aves de Tepa). Con este fin se celebrará una Junta Semanal de Avance.
- London Consulting Group advierte que los resultados operacionales del proyecto, pueden verse afectados por factores externos y fuera de su control que podrían neutralizar el efecto de la implementación efectiva de estrategias.
- Los recursos de apoyo requeridos para llevar a cabo el proyecto deberán ser proporcionados por PATE (Procesadora de Aves de Tepa).
- Se requiere vehículo para el transporte de los consultores.

London Consulting Group

Juntos *transformamos* tu negocio

+35 años

EN EL SECTOR

Compromiso

CON RESULTADOS FINANCIEROS

ROI

GARANTIZADO

AUMENTO DEL

Valor

Transformación

A TRAVÉS DE LAS PERSONAS Y LA TECNOLOGÍA

Ejecución

Shape
Your
Business

London Consulting Group®



Octubre 2026
